


VV-Notat nr 2/2001

ÅRS- OG REGNSKAPSOVERSIKT SIKRINGS- OG MILJØTILTAK I VASSDRAG 2000

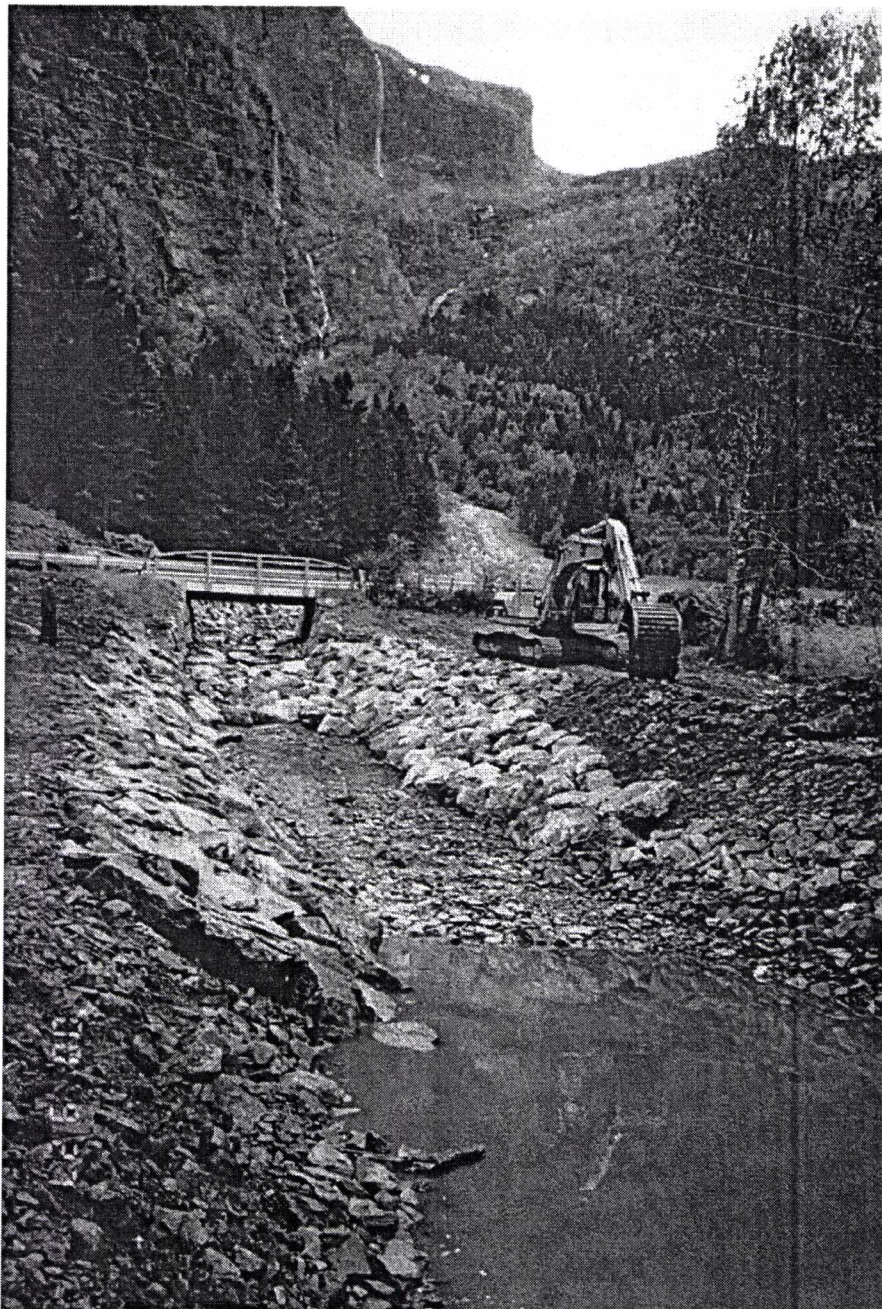

Skogøyda ved Neset, Vik i Sogn

Tittel: Ars- og regnskapsoversikt for sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2000 Kap. 1820, post 30 og 33 (tidligere : Års- og regnskapsoversikt for Vassdragsteknisk seksjon)	
Saksbehandler: Marit Fleischmann Asbjørn Osnes	Dato: 30.okt. 2001
Saksnr. 200107801-1	Arkiv: 046.2



Emneord: Årsrapport Seksjon for Vassdragsteknikk Regionstab / regionkontorene	Ansvarlig underskrift: Steinar Schanche
--	--

VV - NOTAT 2 / 2001

Tittel: Års- og regnskapsoversikt for sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 2000 Kap. 1820, post 30 og 33 (tidligere : Års- og regnskapsoversikt for Vassdragsteknisk seksjon)	
Saksbehandler: Marit Fleischmann Asbjørn Osnes	Dato: 30.10. 2001 Rapporten er åpen
Saksnr. 200107801-1	Arkiv: 046.2

Sammendrag:		
Post 30 Forbygningsarbeider og oppryddingstiltak		
Bevilgning 2000	kr	42.000.000
Bevilget til S-avd.	kr	-500.000
Overført fra 1999	kr	5.125.000
Reduksjon i bevilgn. 27.06.	kr	-3.500.000
Sykepengeordn.	kr	-250.000
Totalt til disposisjon	kr	42.875.000
Utbyggingskostnader NVE	kr	38.226.490
Tilskudd og distriktsandeler, ekskl andre inntekter	kr	14.738.716
Totale prosjektkostnader	kr	52.965.207
NVE Anlegg, underskudd (<i>kontantprinsipp</i>)	kr	3.591.479
Post 34 Flomskader, Solbergfoss, ekstraordinære forbygningsarbeider		
Bevilgning 1998 53 mill kr	kr	
Overført fra 1999	kr	17.722.000
Totalt til disposisjon	kr	17.722.000
Utbyggingskostnader NVE	kr	17.722.000
Tilskudd og distriktsandeler	kr	-
Totale prosjektkostnader	kr	17.722.000
Antall innkomne søknader om bistand til planlegging og utføring av tiltak :		79

Emneord: Årsrapport Seksjon for Vassdragsteknikk Regionstab / regionkontorene	Ansvarlig underskrift: Steinar Schanche
---	---

ÅRS- OG REGNSKAPSOVERSIKT FOR POST 30/34 , VV OG DR

(Års- og regnskapsoversikt for Vassdragsteknisk seksjon)

BEVILGNING OG REGNSKAP

Følgende midler var til disposisjon til forbygnings-, flomsenkings- og flomskadearbeider i 2000:

BEVILGNING KAPITTEL 1820**2000****Post 30 Forbygningsarbeider og oppryddingstiltak**

Bevilgn. 2000	Tot. NVE	kr	42.000.000		
"Gamle dammer" (tidl. Post-70)		kr	-500.000		
Overført fra 1999		kr	5.125.000		
Sykepengeordn.		kr	-250.000		
Reduksjon bevilgning		kr	-3.500.000	Sum til disposisjon	kr 42.875.000

Post 34 Solbergfoss, ekstraordinære forbygningsarbeider (Bevilget 1998 = 53 mill kr)

Overført fra 1999	kr	17.722.000		
Til disp. andre forbygn. samme v.dr.	kr	-	Sum til disposisjon	kr 17.722.000

Sum tattalt post 30 og post 34 = **kr 60.597.000****FORBRUK - REGNSKAPSTALL****2000**

Tabell 1

	Post 30	Kr		Post 34	Kr
Sum til disposisjon		42.875.000			17.722.000
Kostnader post 30 NVE sentralt		3.218.347			-
Prosjekter (inkl. adm. og lønn) regionene, brutto		52.849.311			17.722.000
SUM forbruk		56.067.658			17.722.000
Tilskudd og bidrag+andre inntekter (er inkl. i sum forbruk)		15.054.292			-
Merutgift (-) / Mindreutgift (+)		1.861.634			-
SUM forbruk post 30 og 34				58.735.366	

Inkl. forbruk i post 30/34 på regionkontorene

*Lillestrøm F9333	4.000.000	(post 34)
Solbergfoss F9016	7.731.578	(post 34)
Dam Ula F9273	40.269	(post 30)
Kobbholm	12.621	(post 30)
Kirkenær F9544	2.369.378	(post 30)
Kirkenær F9544	5.990.422	(post 34)
Sum Kirkenær	8.359.800	

"Gamle dammer"(tidl.post 70), sikkerhetsavd.

Overført fra	1999	1.000.000
Bevilgning	2000	500.000
Sum budsjett	2000	1.500.000
Forbruk	2000	984.539
Rest		515.461

*Tot bevilg Lillestrøm 1998 kr 18mil kr, rest pr 31.12.00 = 3,5 mill kr

BEVILGNING 2001**Post 22 (tidl. Post 30) Kap.1820 - Utgifter (bruttobudsjett)**

Bevilget NVE	kr	42.000.000		
Inkl Gml. Dammer (V-stab) kr 500 000				
Overført fra 2000 alle K-sted p 30 kontant	kr	873.709	Sum til disposisjon V/R	kr 42.873.709
Merforbruk - budsjettet				

Post 40 Inntekter (distr.bidrag og LB) Kap. 4820

Statsbudsjett	kr	8.000.000
---------------	----	-----------

SØKNADER OG BEHANDLING VEDRØRENDE TILTAK I VASSDRAG

Antall innkomne søknader om bistand til planlegging og utføring av tiltak i vassdrag : 79

Fordelingen er som følger:

Oversikt over inkomne søknader, antall søknader, mottakssvar avgitt

Tabell 2

Region	1996	1997	1998	1999	2000			
					Innkomne søknader	Behandlede søknader	Avslag på søknader *)	Ubehandlede søknader
RS	9	11	7	8	Ingen oppl.	Ingen oppl.	Ingen oppl.	Ingen oppl.
RØ	64	22	21	31	14	6	3	8
RV	22	22	16	18	12	9	8	3
RM	33	16	32	30	22	12	4	10
RN	26	33	27	33	31	23	5	8
SUM	154	104	103	120	79	50	20	29

*) antall avslag inngår i antallet for behandlede søknader

Oversikt over ubehandlede eldre søknader, antall søknader, mottakssvar avgitt

Tabell 3

Region	Ubehandl. pr. 31.12. 1996	Ubehandl. pr. 31.12. 1997	Ubehandl. pr. 31.12. 1998	Ubehandl. pr. 31.12. 1999	2000		
					Eldre søkn. behandlet	Ubehandlede fra 2000	Ubehandlet pr. 31.12. 2000
Region Sør	26	26	25	25	Ingen oppl.	Ingen oppl.	Ingen oppl.
Region Øst	210	240	125	125	30	8	103
Region Vest	226	226	240	240	193	3	50
Region Midt-Norge	15		253	253	27	10	236
Region Nord	0	0	20	20	5	8	23
SUM	477	492	663	663	255	29	412

Planer utarbeidet i 2000

Tabell 4

Region	POST 30				POST 33		SUM	
	Antall nye planer	Antall rev. eldre planer	Antall planer vedl.hold eldre anl.	Kostnads-overslag kr	Antall planer	Kostnads-overslag kr	Antall planer	Kostnads-overslag kr
RS	Ingen oppl.	Ingen oppl.	Ingen oppl.	Ingen oppl.	Ingen oppl.	Ingen oppl.	Ingen oppl.	Ingen oppl.
RØ	12	0	0	34.787.000	0	0	12	34.787.000
RV	3	0	0	3.500.000	0	0	3	3.500.000
RM	12	0	4	6.165.000	0	0	16	6.165.000
RN	5	0	18	8.175.000	0	0	23	8.175.000
SUM	32	0	22	52.627.000	0	0	54	52.627.000

FINANSIERING AV PROSJEKTER**TILSAGN OM BEVILGNING - POST 30 2000**

Tabell 5

Region	Antall prosj.	Overslag kr
Region Sør	0	0
Region Øst	11	33.717.000
Region Vest	6	4.920.000
Region Midt-Norge	12	10.927.000
Region Nord	0	0
SUM	29	49.564.000

DISTRIKTSVEDTATTE PLANER - POST 30 2000

Planlagte, vedtatte og fullt finansierte prosjekter, og kostnadsfordeling mellom NVE, kommuner og andre:

Tabell 7

Region	Antall prosj.	Overslag kr	Andel NVE kr	Andel (tilskudd) Landbruksbank kr	Andel kommuner kr	Andel andre **) kr	Total finansiering kr
Region Sør	0	0	0	0	0	0	0
Region Øst	4	30.755.000	24.525.000	0	6.230.000	0	30.755.000
Region Vest	10	5.385.000	4.308.000	0	1.077.000	0	5.385.000
Region Midt-Norge	15	12.718.000	7.762.600	1.600.000	3.280.400	75.000	12.718.000
Region Nord	0	0	0	0	0	0	0
SUM	29	48.858.000	36.595.600	1.600.000	10.587.400	75.000	48.858.000

***) inkl. kraftselskaper, Statens vegvesen, NSB

UTFØRTE PROSJEKTER

VEDTATTE, PLANLAGTE OG FINANSIERTE PLANER, INKL. DISTRIKTSVEDTAK, MEN IKKE IGANGSATT - POST 30

Tabell 8

Region	Antall planer	Kostnadsoverslag for ferdige planer inkl. distr. vedtak Ikke igangsatt pr 31.12. 2000	NVEs andel av kostnadene kr	Vedlikeholds-kostnader kr
Region Sør	5	5.223.000	4.178.400	0
Region Øst	10	2.840.600	2.088.280	0
Region Vest	26	6.143.000	4.914.400	0
Region Midt-Norge	18	17.157.500	8.617.500	0
Region Nord		0	0	0
SUM	59	31.364.100	19.798.580	0

UTBYGGINGSKOSTNADER ekskl. lønn og administrasjon
POST 30

Tabell 9

Region			Utbygg.kostn. Kto.gr. 4* kr	Tilskudd fra Landbruksbank kr	Distr. andeler kommuner kr	Tilskudd fra andre ***) kr	Totale prosjekt kostnader kr	Vedlikeholds-kostnader kr
Region Sør			3.554.460	131.767	543.726	16.281	4.246.234	0
Region Øst			7.790.996	205.128	640.567	441.335	9.078.025	0
Region Vest			8.682.572	935.236	1.059.460	1.256.409	11.933.678	0
Region Midt-Norge			14.180.238	3.989.022	2.265.861	2.015.305	22.450.426	0
Region Nord			4.018.224	0	396.586	842.033	5.256.843	0
SUM	0	0	38.226.490	5.261.154	4.906.200	4.571.362	52.965.207	0

*) utbyggingskostnader NVE er eks. lønn og adm.

**) inkl. kraftselskaper, Statens vegvesen, NSB

Andre leie-/inntekter er ikke inkludert

Tot. Tilsk./Bidrag p30- R, kto 3760	14.738.716
Leieinntekt verksted kto 3770 RV	1.350
Andre inntekter kto 3791:	
Form.skole fra Statskonsult R-stab	150.000
Div. inntekter RM	102.238
Div. inntekter RS	23.256
Div. inntekter RV	38.732
Sum tot tilskudd/inntekter	15.054.292

UTBYGGINGSKOSTNADER
POST 34

Tabell 10

Region	Antall prosj.	Overslag kr	Utbygg.kostn. Kto.gr. 4,5,6,7 kr	Tilskudd fra andre kr	Totale prosjekt kostnader kr
Region Sør	1	0	7.731.578	0	7.731.578
Region Øst	2	0	9.990.422	0	9.990.422
Region Vest	27	0	0	0	0
Region Midt-Norge		0	0	0	0
Region Nord	14	0	0	0	0
SUM	44	0	17.722.000	0	17.722.000

*) utbyggingskostnader NVE er eks. lønn og adm.

PLANER IKKE IGANGSATT (saksbehandling, planlegging eller finansierings-avklaring pågår)

Tabell 11

Region	Antall planer	Kostnader kr	Vedlikeholds-kostnader kr
Region Sør	0	0	0
Region Øst	103	0	0
Region Vest	8	9.500.000	1.000.000
Region Midt-Norge	20	100.000.000	40.000.000
Region Nord	0	0	0
SUM	131	109.500.000	41.000.000

	A	B	C	D	E	F
1	KOSTNADER NVE SENTRALT OG REGIONALT					
2	Regnkapsprinsippet					
3	POST 30	2000	Tabell 1:			
4						
5						
6						
7	Adm.enhet	Type kostnad	Brutto budsjett (kr)	Brutto forbruk	Tilsk./bidrag/inntekt	Netto forbruk
8	Sum VV+R+R-stab		kr 61.757.640	kr 56.217.658	kr 15.054.292	kr 41.163.366
9						
10						
11	SUM VV+R-stab		3.660.140	3.368.347	150.000	3.218.347
12	sum VV(+VK/Kobbh.)		2.060.140	1.902.615		
13		adm., prosjekter, etc.	2.060.140	1.902.615		
14	sum R-stab		1.600.000	1.465.732	150.000	1.315.732
15		adm., prosjekter, etc.	1.600.000	1.465.732	150.000	
16	Sum R og Rstab		59.697.500	54.315.043	15.054.292	39.260.752
17	SUM Regioner		58.097.500	52.849.311	14.904.292	37.945.019
18	sum RS		6.547.000	5.262.231		4.547.200
19		Kto.gr.4 varer/entreprise	5.393.000	3.554.460		
20		Kto.gr.6 driftskostn. (+1)	450.000	1.133.740		
21		Kto.gr.5 lønn/arb.avg./velf.	400.000	214.975		
22		Kto.gr.7 reisekostn./kurs	304.000	359.057		
23		NVE-Anlegg	-	-		
24		Kto.gr.9 tilskudd utgående	-	-		
25		Kto.gr.3 tilskudd/bidr. Inngående, andre inntekter			715.031	
26	sum RØ		12.250.000	10.367.049		9.080.020
27		Kto.gr.4 varer/entreprise (+1)	11.100.000	7.790.996		
28		Kto.gr.6 driftskostn.	200.000	1.562.899		
29		Kto.gr.5 lønn/arb.avg./velf.	500.000	565.462		
30		Kto.gr.7 reisekostn./kurs	450.000	623.666		
31		NVE-Anlegg		-253.974		
32		Kto.gr.9 tilskudd utgående	-	78.000		
33		Kto.gr.3 tilskudd/bidr. Inngående, andre inntekter			1.287.029	
34	sum RV		10.842.500	10.684.554		7.393.367
35		Kto.gr.4 varer/entreprise	9.742.500	8.682.572		
36		Kto.gr.6 driftskostn.	370.000	824.754		
37		Kto.gr.5 lønn/arb.avg./velf.	350.000	504.220		
38		Kto.gr.7 reisekostn./kurs	380.000	310.241		
39		NVE-Anlegg	-	-470.884		
40		Kto.gr.9 tilskudd utgående	-	833.650		
41		Kto.gr.3 tilskudd/bidr. Inngående, andre inntekter			3.291.187	
42	sum RM		19.393.000	18.336.072		9.963.646
43		Kto.gr.4 varer/entreprise	18.443.000	14.180.238		
44		Kto.gr.6 driftskostn.	350.000	1.892.746		
45		Kto.gr.5 lønn/arb.avg./velf.	350.000	495.713		
46		Kto.gr.7 reisekostn./kurs	250.000	362.593		
47		NVE-Anlegg	-	1.274.782		
48		Kto.gr.9 tilskudd utgående	-	130.000		
49		Kto.gr.3 tilskudd/bidr. Inngående, andre inntekter			8.372.426	
50	sum RN		9.065.000	8.199.405		6.960.786
51		Kto.gr.4 varer/entreprise	7.975.000	4.018.224		
52		Kto.gr.6 driftskostn.	400.000	658.815		
53		Kto.gr.5 lønn/arb.avg./velf.	240.000	110.834		
54		Kto.gr.7 reisekostn./kurs	450.000	370.318		
55		NVE-Anlegg	-	3.041.554		
56		Kto.gr.9 tilskudd utgående	-	-340		
57		Kto.gr.3 tilskudd/bidr. Inngående, andre inntekter			1.238.619	
58						
59						
60	S. avd- sum	Budsjett	1.500.000			
61		Forbruk	984.539			
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78	9.11.01					

	A	B	C	D	E	F
79	KOSTNADER NVE SENTRALT OG REGIONALT					
80	POST 34					
81						
82	Totalt VV/DR/R		kr 17.722.000	kr 17.722.000	kr -	kr 17.722.000
83	Adm. enhet	Type kostnad	Budsjett (kr)	Brutto forbruk	Tilsk./bidrag/inntekt	Netto forbruk
84					Kto.gr. 3*	(Brutto forbruk÷ bidrag)
85	SUM VV/DR		-	-	-	-
86	sum VV		-	-	-	-
87		adm., prosjekter, etc.				
88	sum R-stab		-	-	-	-
89		adm., prosjekter, etc.				
90	SUM Regioner		17.722.000	17.722.000	-	17.722.000
91	sum RS		17.722.000	7.731.578	-	7.731.578
92		Kto.gr.4 varer/entreprise	17.722.000	7.265.151		
93		Kto.gr.5 lønn/arb.avg./velf.		24.798		
94		Kto.gr. 6-7* adm.,driftkostn.		441.629		
95		Kto.gr. 3* distr.bidrag			-	-
96	sum RØ		-	9.990.422	-	9.990.422
97		Kto.gr.4 varer/entreprise	-	9.837.553		
98		Kto.gr.5 lønn/arb.avg./velf.		-		
99		Kto.gr. 6-7* adm.,driftkostn.	-	152.869		
100		Kto.gr. 3* distr.bidrag			-	-
101	sum RV		-	-	-	-
102		Kto.gr.4 varer/entreprise	-	-		
103		Kto.gr.5 lønn/arb.avg./velf.				
104		Kto.gr. 6-7* adm.,driftkostn.	-	-		
105		Kto.gr. 3* distr.bidrag			-	-
106	sum RM		-	-	-	-
107		Kto.gr.4 varer/entreprise	-	-		
108		Kto.gr.5 lønn/arb.avg./velf.	-	-		
109		Kto.gr. 6-7* adm.,driftkostn.	-	-		
110		Kto.gr. 3* distr.bidrag			-	-
111	sum RN		-	-	-	-
112		Kto.gr.4 varer/entreprise	-	-		
113		Kto.gr.5 lønn/arb.avg./velf.		-		
114		Kto.gr. 6-7* adm.,driftkostn.		-		
115		Kto.gr. 3* distr.bidrag			-	-
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						

SATSINGER (satsingsforslag) - tiltak under utførelse

Tabell 14

Region	Antall prosjekter	Overslag kr	Tildelinger kr	Forbruk pr. 31.12.98 kr	Forbruk 1999 kr	Restbevilgning kr
Region Sør	-	-	-	-	-	-
Region Øst	1	30.200.000	9.000.000	811.933	8.359.798	-171.731
Region Vest	-	-	-	-	-	-
Region Midt-Norge	-	-	-	-	-	-
Region Nord	-	-	-	-	-	-
SUM	1	30.200.000	9.000.000	811.933	8.359.798	-171.731

ANLEGGSVIRKSOMHETEN (ressurser)

Tabell 15

Kontantprinsippet

Region	Omsetning anleggsdrift	Eksterne oppdrag	Driftsresultat	Budsjett maskin/utstyr/brakke	Salg av brakker/ maskiner/utstyr Kto.gr. 18*	Kjøp av brakker/ maskiner/utstyr Kto.gr. 18*
Region Sør	-	-	-	-	-	-
Region Øst	-11.529.438	-1.243.871	-50.000	1.000.000	4.199	1.476.130
Region Vest	-	-	-	-	-	-
Region Midt-Norge	8.122.000	143.000	1.552.000	-	821.865	543.858
Region Nord	-	-	-	-	-	-
SUM	-3.407.438	-1.100.871	1.502.000	1.000.000	826.064	2.019.988

Totalt prosent eksterne oppdrag = 32,31 %

Driftsresultat (Overskudd -) (Underskudd +)

DISTRIKTSANDEL (historisk)

1959 - 1976	forbyggingsarbeider senkingsarbeider flomskadearbeider	25% i Sør-Norge og 20% i Nord-Norge 50 % 1/6 (16%) - 1/5 (20%) , unntaksvis 10%
1976 - 1989		ingen distriktsandel
1990 - 1997		25% (minimum)
fra 01.01.1998		20% (minimum)

INFORMASJON

Gjeldende årstall for rapporten settes først inn på framsiden

Utfylling av rapporten:

Det skal ikke settes inn tall på framsiden. Tallene her blir automatisk satt inn når rapporten fylles ut på de øvrige arkene.

Fyll ut underark "Totale" først. Disse tallene vil automatisk bli overført til de andre underarkene.

Grønne celler er summasjonsceller.

Gule celler får tall automatisk satt inn.

Blå celler er tall satt inn fra tidligere årsrapporter.

Regnearket er beskyttet slik at det kun er de celler det skal settes inn tall som er åpne.

Tabellforklaring:

Tabell 2:

I antallet "Behandlede søknader" inngår de søknader som er saksbehandlet uavhengig av om planprosessen har resultert i en planskisse eller avslag. Antallet for avslåtte søknader på bakgrunn av befaringer eller som et resultat av planprosessen ellers føres opp under "Avslag".

Tabell 3:

Tabellen tar for seg "oppryddingsaksjonen" av gamle planer som har vært lagt på is i lang tid (over 5 år). Disse skulle tas opp til vurdering for planlegging/utførelse eller avslag.

Tabell 4:

En plan er utarbeidet når det er snakk om endelige utbyggingsplaner (planbeskrivelse). Dette innebærer at planen har vært på høringsrunden. Det er ikke satt krav til bevilgningsvedtak her bl.a. pga. beløpsgrensen/myndighetsgrensen på kr 500.000,- eks. mva. til regionsjefen.

Tabell 9 og 10:

I kolonnen for "Overslag" settes overslaget for tiltaket inn, ikke prognose tallet for forbruket gjeldende år.

Tabell 11:

Her settes inn antallet for planer som er under utarbeidelse. I den grad det er mulig angis utbyggingskostnadene.

Tabell 14:

I tabellen føres opp de tiltak som er av typen satsingsforslag og som er under utførelse.

Spørsmål som ble tatt opp under arbeidet med Års- og regnskapsoversikt 1999

1. Hva menes med "Behandlede søknader", jfr tabell 2 og 3? Er en søknad behandlet når vi har vært på befaring, når vi har laget en planskisse, når vi har gitt beskjed til søker om at vi vil gå videre med planlegging/eller gir avslag på videre planlegging, når vi har utarbeidete en planbeskrivelse (plan), når vi har sendt denne fra oss, når vi har fått høringsuttalelser og revidert planbeskrivelsen, når vi har avgitt bevilgningsvedtak, når kommunene har gitt sitt vedtak, når arbeidene er tatt inn i budsjettet, når vi har satt i gang anleggsarbeidene eller når anlegget er ferdig?

Svar:

I antallet "Behandlede søknader" inngår de søknader som er saksbehandlet uavhengig av om planprosessen har resultert i en planskisse eller avslag. Antallet for avslåtte søknader på bakgrunn av befaringer eller som et resultat av planprosessen ellers føres opp under "Avslag".

Tabell 3 tar for seg "oppryddingsaksjonen" av gamle planer som har vært lagt på is i lang tid (over 5 år). Disse skulle tas opp til vurdering for planlegging/utførelse eller avslag.

2. Når er en plan utarbeidet, jfr tabell 4? Er dette når vi har laget planskisse, når vi har laget planbeskrivelse, når vi har revidert planbeskrivelsen på grunnlag av høringsuttalelser eller når bevilgningsvedtak er avgitt?

Svar:

Her er det snakk om endelige utbyggingsplaner (planbeskrivelse). Dette innebærer at planen har vært på høringsrunden. Det er ikke satt krav til bevilgningsvedtak her bl.a. pga. beløpsgrensen/myndighetsgrensen på kr 500.000,- eks. mva. til regionsjefen.

3. Hva er "Overslag" i tabell 9 og 10? Er det tiltakets totale kostnadsoverslag eller forbruksprognose for tiltaket i 1999?

Svar:

Her settes overslaget for tiltaket inn, ikke prognose tallet for forbruket gjeldende år.

4. Hva betyr "Planer ikke igangsatt", jfr tabell 11 ? Er dette vedtatte tiltak som det foreløpig ikke er avsatt midler i budsjettet til, er det totalt antall søknader som det foreløpig ikke er igangsatt fysiske tiltak for, eller er det noe midt i mellom?

Svar:

Her settes inn antallet for planer som er under utarbeidelse. I den grad det er mulig angis utbyggingskostnadene.

5. Hva menes med "Satsinger (satsingsforslag)"? Er dette (budsjettmessige) satsinger som er gjennomført i 1999, satsinger som vi har gjort planleggingsarbeid på i 1999 for utførelse senere, satsingstiltak som vi skal planlegge framover for utførelse en gang i framtida? Skal vi legge regionens egne forslag til satsingstiltak for 2000 og 2001 til grunn, eller NVEs "offisielle" forslag som er sendt OED?

Svar:

I tabellen føres opp de tiltak som er av typen satsingsforslag og som er under utførelse.

Koststed	Gmlstkto	Konto	Budsjett	Beløp
130	182030	3791		-150.000,00
130				-150.000,00
140	182030	3760	-11.566.000,00	-8.270.188,00
140	182030	3791		-102.237,75
140			-11.566.000,00	-8.372.425,75
150	182030	3760	-1.510.000,00	-1.238.618,99
150			-1.510.000,00	-1.238.618,99
160	182030	3760	-1.297.000,00	-691.774,60
160	182030	3791		-23.256,32
160			-1.297.000,00	-715.030,92
170	182030	3760	-3.027.240,00	-3.251.104,97
170	182030	3770		-1.350,00
170	182030	3791		-38.731,69
170			-3.027.240,00	-3.291.186,66
180	182030	3760	-1.482.400,00	-1.287.029,42
180			-1.482.400,00	-1.287.029,42
			-18.882.640,00	-15.054.291,74

2001

1 7000 000

1 650 000

1 800 000

1 950 000

1 2 200 000

240 000

1 22 000 000 - Gräslwa

1050 000

2002 -

1 3.6

20000 000 mill

1 1.2

1 6.5

1 1.5

1 2.4

1 1.7

1 1.1

1 2.5

1 1.2

1 0.3

1 0.2

1 3.6

2004

1 1.

1 2.1

1 0.6

1 22.5

2005 1. 2.4

1. 9.3

1 0.3

1 2.8

1 2.2

1 0.2

12

2003

1 2.1

1 2.1

1 1.2

1 0.4 12.0

1 0.7

1 0.6

1 2.1

7
